

- 石川県内 69 漁港のうち、60 漁港で被災し、外浦地域を中心に地盤隆起している漁港を多数確認。
- 被害の拡大防止や操業開始に向け、応急工事で仮復旧、本復旧を実施。

中島漁港（七尾市管理・第1種漁港）
・船揚場

張ブロックに隙間が発生
→碎石を充填及びコンクリート打設を行い、船揚場の利用を再開



(被災後) (復旧作業の状況)

野崎漁港（七尾市管理・第1種漁港）
・物揚場

本体ブロック倒壊、背後エプロン崩壊
→エプロン撤去及び大型土嚢設置し、増破を防止



(被災後) (復旧作業の状況)

蛸島漁港（県管理・第3種漁港）
[蛸島漁港詳細](#)
・岸壁

岸壁のエプロン背後沈下が発生
→碎石ですり付け、岸壁の利用を再開



(被災後) (復旧作業の状況)

石崎漁港（県管理・第2種漁港）
・物揚場

沈下、損傷による背後臨港道路への海水侵入
→大型土嚢設置し、増破を防止




(被災後) (復旧作業の状況)

富来漁港（県管理・第4種漁港）
[富来漁港詳細](#)
・風戸泊地

地盤隆起により、泊地埋没被害が発生
→泊地内の土砂浚渫完了



(復旧作業の状況)

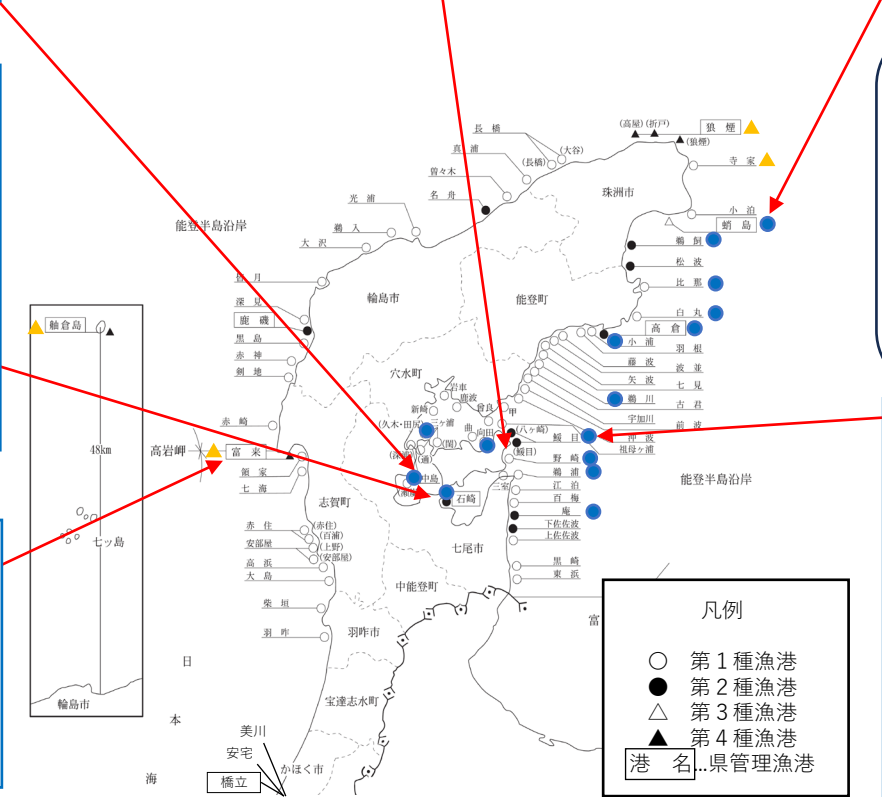

応急工事の実施状況

▲ 実施中：実施中又は実施予定の応急工事がある漁港※1

● 完了：全ての応急工事了した漁港※2

無印 未実施：応急工事を行っていない漁港

※1複数の応急工事実施箇所がある場合、全ての工事が完了するまで実施中としている
※2○を付した漁港で、追加の応急工事が生じた場合には△に変更する場合がある

鰻目漁港（七尾市管理・第2種漁港）
[鰻目漁港詳細](#)
・物揚場

物揚場のエプロン沈下が発生
→アスファルトですり付け、物揚場の利用を再開



(被災後) (復旧作業の状況)

完了した主な応急工事（R6.5.1）

	漁港名	施設名	主な応急工事の内容	完了時期	
県管理	石崎	-2.0m物揚場	大型土嚢の設置工事完了	1月中旬	
		-2.0m物揚場	エプロンの段差部分へのアスファルト舗装、敷鉄板設置工事完了	4月上旬	
	富来	船揚場	レールを設置しているコンクリート下部の空隙復旧工事完了	2月中旬	
		船揚場	先端止めブロック及び張ブロックの作成、設置による斜路延伸工事完了	4月中旬	
		風戸泊地	泊地内の土砂浚渫工事完了	4月中旬	
		物揚場	上部工とエプロンの隙間及び段差に砕石を充填等の復旧工事完了	4月下旬	
		臨港道路	沈下した道路側溝の復旧工事完了	4月下旬	
		-3.5m岸壁	沈下・隙間部分に砕石等を充填、エプロン舗装工事完了	4月下旬	
	蛸島	-4.5m岸壁	段差ひび割れへの砕石すり付け工事完了	2月中旬	
		臨港道路	舗装の段差への砕石すり付け、アスファルト舗装工事完了	3月中旬	
		臨港道路	舗装の段差への砕石すり付け工事完了	4月中旬	
		臨港道路	アスファルト舗装沈下部分へのアスファルト舗装工事完了	4月中旬	
		臨港道路	アスファルト舗装沈下部分への補足材充填工事完了	4月中旬	
	高倉	姫第1岸壁	エプロン亀裂、段差の陥没部に砕石充填工事完了	3月上旬	
市町管理	鶴飼	防波堤	港内に散乱した消波ブロックの移設工事完了	4月中旬	
	鶴川	鶴川物揚場	エプロン沈下へのエプロン撤去、陥没部に砕石充填及び敷き鉄板の仮舗装工事完了	3月中旬	
		物揚場	エプロン沈下への上部工の切り欠き工事完了	4月下旬	
	白丸	直立護岸	倒壊したバラベットの撤去、大型土嚢の設置、津波堆積物移動工事完了	3月下旬	
		直立護岸	倒壊したバラベットの撤去、大型土嚢の設置、津波堆積物移動工事完了	3月下旬	
		直立護岸	倒壊したバラベットの撤去、大型土嚢の設置工事完了	3月下旬	
		直立護岸	倒壊したバラベットの撤去、大型土嚢の設置工事完了	3月下旬	
	比那	物揚場	大型土嚢の設置工事完了	3月上旬	
	小浦	物揚場	エプロンのひび割れ沈下段差への敷鉄板設置工事完了	3月上旬	
	中島	船揚場	張ブロックの隙間、段差への砕石充填工事完了	2月上旬	
		漁港輸送道路	臨港道路の段差、亀裂への舗装版撤去、砕石擦り付け工事完了	2月上旬	
		漁港輸送道路	舗装面の段差及び沈下部分へのアスファルトすり付け、亀裂部分の仮舗装工事完了	3月下旬	
		鯨目	第2物揚場	エプロン沈下への砕石、アスファルトすり付け工事完了	2月上旬
			物揚場	エプロン沈下への砕石、アスファルトすり付け工事完了	2月上旬
			臨港道路	舗装面の段差へのアスファルトすり付け、損傷個所のアスファルト仮舗装	3月下旬
	三ヶ浦	物揚場	エプロン沈下への上部コンとエプロン隙間に砕石充填工事完了	2月上旬	
		船揚場	斜路部の張ブロックが移動・沈下への止壁と張ブロックの隙間に砕石を充填工事完了	3月上旬	
		物揚場	エプロン沈下、破損、段差、隙間への砕石充填工事完了	2月中旬	
		臨港道路	亀裂、段差への砕石充填工事完了	3月上旬	
		庵	-2.0m物揚場	エプロン沈下への砕石、アスファルトすり付け工事完了	3月上旬
	-2.5m物揚場		エプロン沈下への砕石、アスファルトすり付け工事完了	3月上旬	
	鶴浦	船揚場	斜路部の張ブロックが移動・沈下への砕石擦り付け工事完了	3月上旬	
		臨港道路	段差、亀裂への砕石すり付け、充填工事完了	3月上旬	
	野崎	物揚場	大型土嚢の設置及びエプロン撤去工事完了	3月上旬	
	向田	船揚場	斜路の隙間、段差への砕石、コンクリートすり付け工事完了	3月上旬	
		臨港道路	段差、亀裂への舗装版撤去、砕石埋め戻し工事完了	3月上旬	
