

浜田地区

水産流通基盤整備事業 期中評価

浜田地区の期中評価の概要


- 浜田漁港では、主要漁業である巻き網漁業による漁獲物の安定した受入態勢を確保するため、冷凍及び冷蔵施設の整備を計画（平成28年度）
- 事業採択後、陸揚量の急激な変動（減少）があり、事業実施にあたり慎重な判断を要しているところ、事業未着手のまま5年が経過

事業主体：漁業協同組合JFしまね

主要工事計画：冷凍及び冷蔵施設1式

事業費：1,700百万円

事業期間：平成28年度～平成29年度

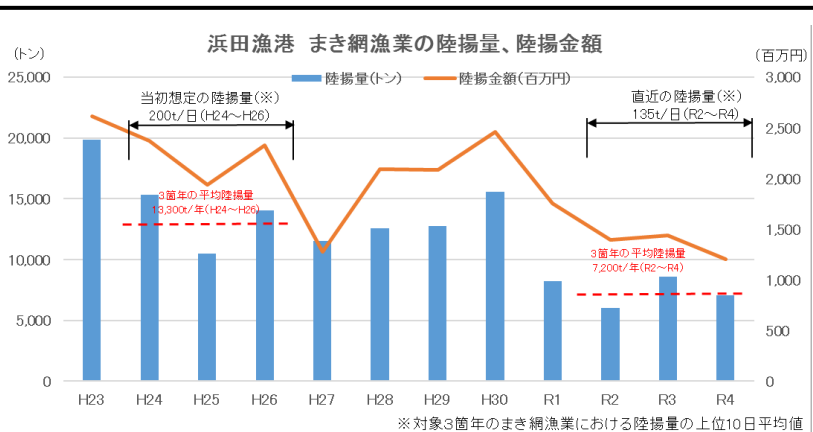

- 関係自治体及び漁協において、浜田漁港における陸揚量の確保に向けた取組（漁船誘致等）を実施しているところ。
- その効果の発現には一定に期間を要すことから、事業着手の時期については、改めて検討することとし、それまでの間は**事業を休止する**ことが妥当であると判断。
