

平成16年台風18号及び平成18年台風13号による鹿児島県中甕漁港の被害と復旧状況について

○平成16年9月5日～8日の台風18号による被害状況

被害報告額:7億円

くらつま

倉妻防波堤 L=150.0m

・ケーソン8函が滑動・転倒

工事完了年月日:平成18年9月12日

○平成18年9月16日～17日の台風13号による被害状況

被害報告額:3.5億円

くらつま

倉妻防波堤 L=54.0m

・先端部ケーソン2函転倒

工事完了年月日:平成19年8月30日



被災状況



復旧状況

平成18年10月4日～9日の低気圧に係る漁港関係被害と復旧状況について

●被害状況

北海道、青森県等の東北太平洋沿岸を中心に7道県の98漁港において、防波堤・護岸等が被災。漁港施設等の水産関係被害報告額は約159億円。

青森県大畑漁港の被害

○被害の状況

被害報告額：約72億円

第2外北防波堤

L=285m

ケーソン18函 滑動、転倒
全延長にわたり被災

第4東防波堤

L=565m

ケーソン28函 滑動、転倒
全延長にわたり被災

被災状況



全景

復旧状況(平成20年10月現在)



第2外北防波堤



第4東防波堤

○復旧状況

・堤体工及び押え盛石工は完了(平成20年10月末現在)。

現在、上部工を施工中であり、第2外北防波堤及び第4東防波堤とも平成21年3月に完了予定。

北海道古部漁港の被害

○被害の状況

被害報告額: 11億円

東防波堤 L=105.5m

・場所打式本体工 L=70.0m

(鋼製函1函転倒、7函滑動・傾斜)

・消波工 L=103.0m


(15t、25t(堤頭部)ブロック飛散・沈下)

○復旧状況


東防波堤の堤体工及び消波ブロック水中据付は完了(平成20年10月末現在)。残工事として消波工の水上部ブロック据付、上部工等を施工中であり、平成21年3月に完了予定。



被災状況

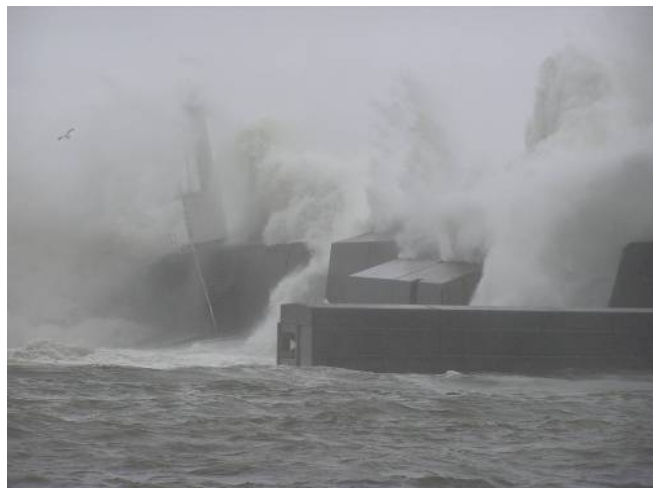

波浪状況

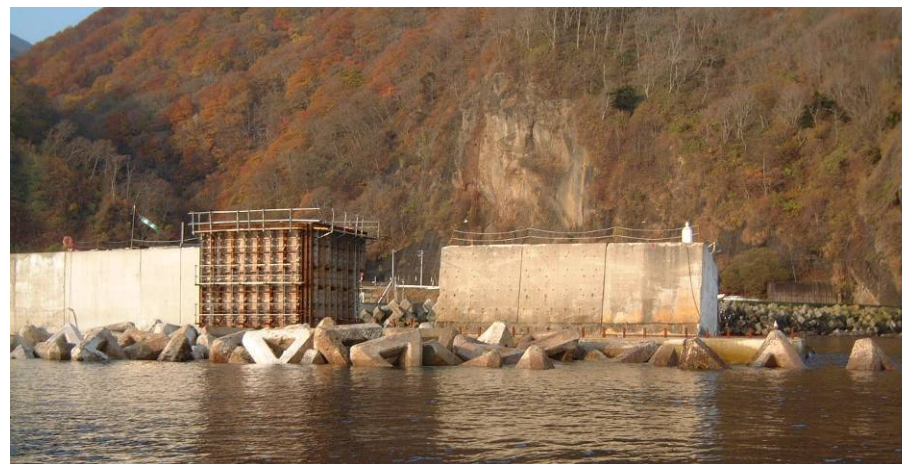

復旧状況
